



Université
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)



Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)

**RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET RECOMMANDATION POUR
L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ**

Référence de la procédure: **DRP N° 06T/2021/UL-CERME/IDA du 15 novembre 2021**

Projet : **Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité
(CERME)**

Autorité Contractante: **Université de Lomé (UL)**

Pays (Emprunteur) : **Togo**

Source de financement : **Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)
Don IDA 536 (Banque Mondiale)**

décembre 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SOMMAIRE

GENERALITES	3
I- ÉVALUATION ET D'ANALYSE DES OFFRES	3
1-1 La sous- commission technique chargée de l'évaluation	4
1-2-1 Tableau 1 : Identification du Projet	5
1-2-2 Tableau 2 : Procédure d'évaluation	6
1-2-3 Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis	7
II EVALUATION DES OFFRES	8
2-1 Procédure d'analyse des offres	8
2-2 Examen préliminaire des offres :	8
2-3 Examen détaillé des offres :	8
2-4 Vérification a posteriori :	9
3-1 OUVERTURE DES OFFRES DU LOT UNIQUE	11
3-2 Examen préliminaire	12
3-3 Examen détaillé des offres du lot unique	12
3-3-1 Corrections examen détaillé et rabais inconditionnels	12
3-3-2 Conversion des offres aux fins de comparaison	14
3-4 Valorisation monétaire	14
3-6- Vérification a posteriori : lot unique	14
3-7 Attribution du Marché	17
ANNEXES	21

GENERALITES

Dans le cadre du Projet des Centres d'Excellence de l'enseignement supérieur de l'Afrique pour un impact sur le développement (CEA-Impact), initiés par la Banque mondiale pour améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement postuniversitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre y compris Djibouti, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement (Crédit IDA 6512-TG et Don IDA 536) pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) à l'Université de Lomé.

Une partie de ce financement sera utilisée pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)».

A cet effet, la demande de renseignement de prix (DRP) N° 06T/2021/UL-CERME/IDA a été élaborée et soumise à l'avis de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l'Université de Lomé.

Suite à la validation de la présente DRP, suivant procès-verbal de délibération N°181/CCMP/11-2021 du 09 novembre, l'Avis de renseignement de prix (ADRP) est paru dans Togo-Presse N°11166 en date du 16 novembre 2021.

Une réunion préparatoire suivie d'une visite de sites a été organisée le 23 novembre 2021. A l'issue de la visite, un addendum a été soumis à l'ensemble des entreprises ayant acquis le dossier d'appel à concurrence.

La date de clôture de dépôt des offres, initialement prévue au mardi 30 novembre 2021 à 16 heures GMT a été prorogée au mardi 07 décembre 2021 à 10 heures 00 GMT.

A cette nouvelle date limite de dépôt, cinq (05) offres ont été réceptionnées. La séance d'ouverture est survenue le même jour à 10 h 30.

Le présent rapport résume les résultats du processus d'analyse des offres enregistrées, assorti d'une recommandation d'attribution.

I- ÉVALUATION ET D'ANALYSE DES OFFRES

A la suite de la clôture de dépôts et d'ouverture des offres, une sous-commission technique chargée de l'évaluation, mise en place suivant Note de service N°054/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021, s'est retrouvée du **07 au 09 décembre 2021** à Kpalimé et le 29 décembre à Lomé, pour procéder à l'évaluation des offres réceptionnées.

Au cours de la vérification relative à la qualification, la sous-commission, a relevé au titre du matériel à mobiliser pour l'exécution des travaux que l'entreprise DMA GROUP Sarlu

S
B
J
Z
F

a déclaré que les camions benne et citerne à eau à mobiliser pour ladite fin sont requis en propriété sans toutefois fournir des preuves de leur disponibilité (carte grise, reçu d'achat et autres) conformément au point 6 de l'Annexe A « Critères de qualification » du dossier d'appel à concurrence.

Afin de finaliser le processus d'évaluation, le courrier N°1097/UL/CP/PRMP/12-2021 du 14 décembre 2021, a été adressée à l'entreprise DMA GROUP Sarlu aux fins d'informations complémentaires notamment les preuves liées à la disponibilité de ces deux (02) matériels, sous sept (07) jours calendaires au plus tard, à compter de la date de réception du présent courrier.

Après la soumission des informations complémentaires par l'entreprise DMA GROUP Sarlu, suivant courrier Réf : n° 0149/DMA/DG/2021 du 21 décembre 2021, la sous-commission, s'est, à nouveau, retrouvée le 29 décembre 2021 pour finaliser le processus d'évaluation.

1-1 La sous- commission technique chargée de l'évaluation

La sous- commission technique est composée des membres comme l'indique le tableau ci-après :

N°	Nom	Fonction	Rôle
1	M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	<i>Président</i>
2	M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Spécialiste en Passation des Marchés du CERME	<i>Rapporteur</i>
3	M. ALLOKPENOU Enoussa	Spécialiste en Gestion Financière du CERME	<i>Membre</i>
4	Mme PADASSE Mazahalou Adédémèwè	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	<i>Membre</i>
5	M. SEBOU Igoma	Ingénieur en génie civil à l'ENSI	<i>Membre</i>
6	M. SETEKPO Ayéwu	Technicien en génie électrique à l'ENSI	<i>Membre</i>
7	M. BADJO Koussowa	Membre de la cellule d'appui à la PRMP	<i>Membre</i>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Y', a 'B', and several other stylized marks.

1-2 Les Préalables :

1-2-1 Tableau 1 : Identification du Projet

1.1	Nom de l'Emprunteur	Le Gouvernement de la République Togolaise
1.2	Numéro du crédit IDA	IDA crédit 6512-TG
1.3	Date d'entrée en vigueur du crédit	09 janvier 2020
1.4	Date de clôture du crédit:	
	a) initiale	30 juin 2024
	b) modifiée	Sans objet
1.5	Nom du projet	Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
1.6	Acheteur (ou Employeur)	Université de Lomé / CERME
	a) nom	Directeur du CERME
	b) adresse	CERME, sise dans l'enceinte de l'Université de Lomé, Boulevard GNASSINGBE EYADEMA, BP : 15 15, Tél : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, Email : cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org
1.7	Numéro (d'identification) du marché	DRP N° 06T/2021/UL/PRMP-CERME/IDA du 15 novembre 2021
1.8	Description du marché	Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)
1.9	Estimation du coût	US \$ 6 000 000 (six millions)
1.10	Méthode de passation des marchés	AOI __ AOR __ DRP <u>X</u> _
1.11	Examen préalable	Oui __ Non <u>X</u> _
1.12	Préférence en faveur du pays de l'Emprunteur	Oui ____ Non <u>X</u> _
1.13	Marché à prix forfaitaire	Oui __ Non <u>X</u> _
1.14	Cofinancement, le cas échéant :	Non
	a) nom de l'organisme	_____
	b) pourcentage financé par cet organisme	_____

B

1-2-2 Tableau 2 : Procédure d'évaluation

2.1	Avis général de passation des marchés	
	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	
2.2	Présélection, si nécessaire	
	a) Nombre d'entreprises présélectionnées	Sans objet
	b) Date de l'avis de non-objection de la Banque	Sans objet
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
	a) Nom d'un journal de diffusion nationale	Sans objet
	b) Date de publication	Sans objet
	c) Nom d'une publication internationale	Sans objet
	d) Date de publication	Sans objet
	e) Nombre d'entreprises notifiées	Sans objet
2.4	Dossier type d'appel d'offres	
	a) Titre, date de publication	DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX pour la Passation des marchés de travaux, septembre 2020
	b) Date de l'avis de non-objection de la Banque	N/A
	c) Date de présentation aux candidats	15 novembre 2021
2.5	Nombre d'entreprises ayant reçu le dossier	08
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
	a) Indiquer les dates des différentes publications	Sans objet
	b) Date(s) de l'avis de non-objection de la Banque	N/A
2.7	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	23 novembre 2021
2.8	Date du procès-verbal de la réunion qui est envoyé aux candidats et à la Banque	N/A

Handwritten blue ink marks: a checkmark, a bracket, a symbol resembling a stylized 'f', a symbol resembling a stylized 'A', a symbol resembling a stylized 'Z', and a symbol resembling a stylized 'n'.

1-2-3 Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
	a) Date et heure de dépôt initiales	30 novembre 2021 à 16 heures 00 minutes GMT
	b) Prorogations, le cas échéant	07 décembre 2021 à 10 heures 00 GMT
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	07 décembre 2021 à 10 heures 30 minutes GMT
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la Banque	Sans objet
3.4	Nombre d'offres soumises	Cinq (05)
3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
	a) Prévues au départ	90 jours
	b) Prorogations, le cas échéant	Néant
	c) Date/(s) de l'avis de non-objection de la Banque, le cas échéant	Néant

Le procès-verbal d'ouverture des plis est annexé au présent rapport d'évaluation.

Handwritten marks: a checkmark, the letter 'B', a vertical line with a hook, the letter 'F', a checkmark, and a small symbol resembling a lowercase 'a'.

II EVALUATION DES OFFRES

2-1 Procédure d'analyse des offres

La procédure d'ouverture et d'évaluation des offres est décrite dans la section 2 / chapitre E des Instructions aux Soumissionnaires (IC), de l'article 11 à 16, complétées par les Données Particulières de la Demande de Renseignement des prix (DPDRP).

L'évaluation s'est déroulée en trois étapes :

- Examen préliminaire des offres ;
- Examen détaillé des offres ;
- Vérification à posteriori.

2-2 Examen préliminaire des offres :

L'examen préliminaire des offres a comporté deux phases :

- La vérification de la présence et de la validité des pièces qualificatives et financières fournies dans l'offre (notamment, le formulaire de soumission, le bordereau des prix, la confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire et la garantie de l'offre d'un montant de **quatre cent mille francs (400 000) francs CFA** délivrée par une banque, l'engagement à respecter les dispositions du code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics..).
- La vérification de l'éligibilité du soumissionnaire et des fournitures proposées, l'exhaustivité et la conformité substantielle de l'offre par rapport aux conditions spécifiées dans le dossier d'appel à la concurrence.
- La conformité de l'offre pour l'essentiel a été jugée en comparant les spécifications techniques proposées par le soumissionnaire à celles demandées dans la Demande de renseignement de prix (DRP).

Tout manquement à ces spécifications, susceptible d'affecter sensiblement la qualité et les performances attendues des articles proposés, équivaut à une non-conformité « NC ».

Les non-conformités ou manquements aux spécifications techniques qui n'altèrent pas la conformité des articles pour l'essentiel seront signalés dans le tableau de comparaison des spécifications techniques par une « non-conformité relative » **NCR** portée en exposant.

L'examen de la conformité pour l'essentiel des offres par rapport aux spécifications techniques exigées, figure en annexe 1 du présent rapport.

2-3 Examen détaillé des offres :

L'examen détaillé a porté sur les offres retenues à l'issue de l'examen préliminaire. Cet examen consiste en :

1. la correction des erreurs de calcul ;
2. le calcul des rabais inconditionnels (% et/ou montant)
3. La conversion de l'offre en une seule monnaie ;
4. Les ajustements, comme indiqué dans les DPRP, résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation, des méthodes et critères sélectionnés parmi ceux indiqués à la Section III : Critères d'évaluation et de qualification et ;
5. Le classement des offres, par ordre de prix croissant.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'A' and several other marks.

2-4 Vérification a posteriori :

Conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC de la DRP, objet de concurrence, l'Autorité contractante déterminera si le Candidat choisi pour avoir soumis l'offre conforme évaluée la moins disante, a la capacité d'exécuter le Marché de façon satisfaisante selon les exigences du formulaire de qualification. Aucun facteur qui n'est défini ci-dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire

2.4.1. Capacité financière

- **Etats financiers/Chiffres d'affaires moyen des exercices 2018, 2019 et 2020 :** Le soumissionnaire doit avoir une moyenne des chiffres d'affaires des **trois (03) années suivantes (2018, 2019 et 2020) égale au moins à zéro virgule cinq (0,5) fois** le montant de son offre (démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa rentabilité à long terme) et ;
- **Capacité de financement :** Le soumissionnaire doit également fournir une attestation de disponibilité de crédit d'un montant égale à **0,5 fois au moins le montant de son offre financière**, délivrée par une banque.

NB : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l'impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années exigées, sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l'attestation de capacité financière.

2.4.2. Expérience

Le soumissionnaire doit prouver, documentation à l'appui, qu'il a exécuté à titre d'entrepreneur, de sous-traitant au **moins deux (02) projets des travaux de taille ou de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.**

A cet effet, le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste des marchés exécutés ainsi les copies des preuves de leur exécution (attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception) délivrées par le (s) client (s).

2.4.3. Charge de l'entreprise

Le soumissionnaire doit justifier de la réalisation ou de la probabilité de l'exécution des travaux en cours à hauteur **de soixante dix pour cent (70%)** à la fin du 6^{ème} mois suivant la date limite de dépôt des offres. Le soumissionnaire devra ainsi joindre à son offre, le plan de charge indiquant le taux d'exécution de ses travaux en cours.

Handwritten signature and initials, including a large 'S' and 'F' and a small 'n' at the bottom right.

2.4.4. Personnel

Le soumissionnaire doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

No.	Poste	Qualification requise	Effectif	Nombre d'années d'expérience requis pour le poste	Nombre de marchés similaires requis
1	Conducteur des travaux	Ingénieur (BAC+5) en génie civil ou équivalent	01	03 ans	Au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments
		Ingénieur de travaux (BAC+3) en génie civil	01	05	Au moins trois (03) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments
		Brevet de Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil	01	07	
2	Chef chantier	Ingénieur des travaux : Licence (BAC+3) en génie civil ou équivalent	01	03 ans	Au moins deux (2) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Chef de chantier des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments
		Brevet de Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil ou équivalent	01	05 ans	
3	Expert environnementaliste	BAC+4 en sciences naturelles ou autres domaines équivalents au minimum	01	05 ans	Au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires dont un (01) en qualité d'Expert environnementaliste

2.4.5. Matériel

Le soumissionnaire doit également établir qu'il a les matériels suivants :

No.	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis	Disponibilité
1	Bétonnière (500 l au moins)	01	Propriété ou location
2	Véhicule de liaison (chantier)	01	Propriété ou location
3	Camion benne	01	Propriété ou location
4	Camion-citerne à eau	01	Propriété ou location

Handwritten signature and initials: *J S B J A*

III EVALUATION DU LOT UNIQUE

3-1 Ouverture des offres du lot unique

Quatre (04) offres ont été remises dans le délai tandis qu'une (01) offre a été remise hors délai (en retard). Les résultats de l'ouverture se présentent comme l'indique le tableau ci-après :

Tableau 4 : Résultats de l'ouverture des offres

Ordre d'ouverture	Nom du soumissionnaire	Lettre de soumission datée et signée	Bordereau des prix dûment remplis et signés	Garantie de soumission (400 000 FCF)	Délai de validité de l'offre	Formulaire d'engagement dûment rempli et signé
1	GTR	F	F	F	90 ¹ jours	F
2	ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	F	F	F	90 jours	F
3	DMA GROUP	F	F	F	90 jours	F
4	LOCA BTP	F	F	F	90 jours	F

NB/ * F= Pièce fournie, NF=Pièce non fournie

- *Un pli appartenant à l'entreprise ECNG-BTP, réceptionné à 10 heures 45 minutes alors que l'heure limite fixée dans l'addendum communiqué (à tous les candidats ayant acquis la DRP) est 10 heures GMT, soit 45 minutes de retard, n'a pas été ouvert. Des dispositions ont été prises pour le retour dudit pli à son auteur par voie officielle.*

Les quatre (04) offres, remises dans le délai, ont subi l'examen préliminaire.

Tableau 5 : Prix des offres (lus publiquement) lot unique

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)			
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie (s)	e) Montant HT	f) Montant TTC	g) Modifications ou commentaires
GTR	Lomé	Togo	F CFA	-	47 138 143	Rabais : 7% sur le TTC
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	Lomé	Togo	F CFA	-	48 262 624	Rabais : 15%
DMA GROUP	Lomé	Togo	F CFA	-	49 757 072	Rabais : 20%
LOCA BTP	Lomé	Togo	F CFA	38 435 721	45 354 151	Rabais : 12%

¹ GTR : La lettre de soumission de ce soumissionnaire ne précise pas en termes de quantité, le délai de validité de son offre. Toutefois, il a déclaré se conformer au délai de validité de 90 jours exigés par le dossier de demande de renseignement de de prix (DDRP), objet de concurrence.

f v s

3-2 Examen préliminaire

Tableau 6 : Examen préliminaire lot unique.

a) Soumissionnaire	b) Vérification	c) Critères de provenan ce	d) Garantie de l'offre	e) Exhausti vité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
GTR	NON ²	N/A	OUI	OUI	NON	NON
ETUDES ET CONSTRUCTIO N (EC) Sarl	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
DMA GROUP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
LOCA BTP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI

A l'issue de l'examen préliminaire, le soumissionnaire GTR a proposé un délai d'exécution des travaux de 150 jours ou cinq (05) mois contrairement au délai exigé au point 1 de la section I (**Avis de demande de renseignement de prix**) du dossier de concurrence (quatre vingt dix jours (03 mois)), soit un dépassement de soixante (60) jours ou deux (02) mois par rapport au délai requis.

L'offre de GTR, de ce fait, ne satisfait pas au critère d'examen a priori. Elle n'est pas alors admise pour l'examen détaillé.

Toutefois, les offres de trois (03) autres soumissionnaires à savoir EC Sarl, DMA GROUP et LOCA BTP, répondant à ce critère, sont retenues pour l'examen détaillé.

3-3 Examen détaillé des offres du lot unique

3-3-1 Corrections examen détaillé et rabais inconditionnels

- ❖ Vérification des calculs arithmétiques : Tous les prix figurant dans les offres répondant au critère d'examen préliminaire, ont été recalculés à partir des prix unitaires et des quantités par rubrique suivant le descriptif quantitatif du dossier de concurrence. La sous-commission a procédé à la vérification des calculs arithmétiques.

Les résultats de cette vérification des calculs et corrections sont consignés dans le tableau ci-après (n° 7).

² GTR a proposé un délai d'exécution des travaux de 150 jours, soit cinq (05) mois contrairement au délai exigé au point 1 de la section I (Avis de demande de renseignement de prix) du dossier de concurrence, soit un dépassement de soixante (60) jours ou deux (02) mois par rapport au délai exigé par le dossier. L'offre est de ce fait non conforme pour l'essentiel

Tableau 7 : Corrections et rabais inconditionnels

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement			Corrections		g) Prix de l'offre corrigé HT (g = c + e)	Rabais inconditionnels		j) Prix de l'offre corrigé/avec rabais HT j = (g - i)	k) TVA k = (j * 18%)	l) Prix de l'offre corrigé/avec rabais TTC l = (j + k)
	b) Monnaie (s)	Montant(s)		e) Erreurs de calcul	f) Sommes provisionnelles		h) Taux	i) Montant(s) (i = g * h)			
		c) HT	d) TTC								
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	FCFA	40 900 529	48 262 624	+11 460 ¹	N/A	40 911 989	7%	2 863 839	38 048 150	6 848 667	44 896 817
DMA GROUP	FCFA	-	49 757 072	00	N/A	42 167 010	20%	8 433 402	33 733 608	6 072 049	39 805 657
LOCA BTP	FCFA	38 435 721	45 354 151	-57 270 ²	N/A	38 378 001	12%	4 605 360	33 772 641	6 079 075	39 851 716

¹ EC SARL : Erreur de report de quantité au poste 2.5 de la Salle N°5 des techniciens de Labo du G-E; 2,21 comme quantité considérée à ce poste par le soumissionnaire en lieu et place de 2,31 retenue par le dossier de concurrence, soit une différence de $2,10 \times 20000 = 2000$ FCFA ajoutée à son offre + Erreur de calcul au poste 6.2 de la salle 11-1 (EAMAU): 15300 en lieu et place de 15030, soit une somme de 270 FCFA soustraite de son offre + Erreur de calcul au poste 7.2 de la salle 11-2-Salle de classe: 15300 FCFA communiqués en lieu et place de 15030 FCFA, montant normal de ce poste, soit une somme de 270 FCFA soustraite de son offre + Erreur de report de prix unitaire au niveau de DQE au poste 13.9 des TOILETTES 11.4 (Sortie Est au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'ENSI) : Au lieu de 7000 F CFA indiqués dans le BPU comme prix unitaire, le soumissionnaire a reporté 6000 F CFA dans son DQE, soit une différence de $1000 \times 1 = 1000$ FCFA augmentés à son offre + Erreur de report de prix unitaire au niveau de DQE du poste 13.10 des TOILETTES 11.4 (Sortie Est au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'ENSI) : Au lieu de 10 000 F CFA indiqués dans le DQE le soumissionnaire a reporté 7000 F CFA comme PU dans son DQE, soit une différence de $3000 \times 3 = 9000$ f CFA augmentés à son offre. **Résultats des corrections des erreurs : + 2 000 - 270-270+1000+9000 = 11 460 FCFA ajoutés à l'offre du soumissionnaire.**

² LOCA BTP : Erreur de calcul au poste 3.4 de la Salle 6-4-Salle de classe: 295 920 FCFA comme montant communiqué par le soumissionnaire à ce poste en lieu et place de 238 200 FCFA, montant normal, soit une différence de **57 720 FCFA soustraite** de son offre.

(Handwritten marks: a large blue scribble, a blue 'B', a blue 'A', and a blue '34')

3-3-2 Conversion des offres aux fins de comparaison

Non applicable.

3-4 Valorisation monétaire

Le calcul du prix total de l'offre intégrant les ajouts pour omission, ajustements et variations mineures fait l'objet du tableau 8 ci-après :

Tableau 8 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)

Monnaie retenue pour l'évaluation : __F CFA__

a) Soumissionnaire	b) Prix TTC de l'offre corrigé/raba is inclus	c) Ajouts pour omission	d) Ajustement s	e) Variation s mineures	f) Prix TTC total en FCFA (f) = (b) + (c) (d) + (e)
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	44 896 817	0	N/A	0	44 896 817
DMA GROUP	39 805 657	0	N/A	0	39 805 657
LOCA BTP	39 851 716	0	N/A	0	39 851 716

3-4 Classement des offres après évaluation du lot unique

Tableau 9 : Classement des offres selon l'ordre croissant de leur montant

Nom du Soumissionnaire	Montant TTC évalué de l'offre en F CFA	Classement
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	44 896 817	3 ^{ème}
DMA GROUP	39 805 657	1 ^{er}
LOCA BTP	39 851 716	2 ^{ème}

3-6- Vérification a posteriori

Après examen détaillé, l'offre du soumissionnaire DMA GROUP, classé 1^{er}, est admise à la vérification a posteriori.

3.6.1. Eligibilité

Répondant à tous les critères d'éligibilité, l'entreprise DMA GROUP est admise à participer à l'appel à concurrence.

(Handwritten signature and mark)

3.6.2. Antécédents de défaut d'exécution de marché

Il n'a aucun antécédent de litige.

3.6.3. Situation et Performance Financières

Suivant les dispositions contenues dans le point IC 6.1d) des données particulières et spécifiquement 2.1. de l'Annexe A « **Critères de qualification** » du dossier de concurrence, le soumissionnaire DMA GROUP a fourni des états financiers et la preuve sur sa capacité de financement :

➤ **Chiffre d'affaires annuel moyen**

Le soumissionnaire DMA GROUP a présenté des états financiers des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) conformément aux exigences de la Demande de Renseignement de Prix (DRP), objet du présent marché. Les chiffres d'affaires en FCFA de ces années (2018, 2019 et 2020) correspondant respectivement à (48 034 824, 84 320 525 et 139 693 157) dont **la moyenne en FCFA (90 682 835), est supérieure à zéro virgule cinq (0,5) fois le montant de son offre (39 805 657)** suivant les indications du point 2.2 de l'annexe A ci-dessus référencée.

➤ **Capacité de financement / Disponibilité de crédit :**

Le soumissionnaire DMA GROUP a fourni une **attestation de capacité financière** référencée V/R : 115/DMA/DG/2021 et N/R : STE/DMA/061/11/2021 en date du 29 novembre 2021 délivrée par la SOCIETE INTERNAFRICAINE DE BANQUE (SIAB) d'un **montant de 100 000 000 FCFA** ferme et net de tout engagement. Ce montant est supérieur à **0,5 fois le montant TTC de son offre financière qui s'élève à 39 805 657 FCFA** suivant les dispositions du point 2.3 de l'annexe A ci-dessus référencée..

L'offre de DMA GROUP satisfait donc à la condition de la clause IC 6.1d), spécifiquement au point 2. de l'annexe A de la DRP relative à la capacité financière.

3.6.4. Expérience:

Conformément au point IC 6.1d) et spécifiquement au point 3 de l'Annexe A du dossier de concurrence, le soumissionnaire DMA GROUP:

- (i) a présenté dans son offre des preuves d'exécution de plusieurs marchés similaires dont
 - Travaux de construction du bâtiment de l'usine de transformation des ananas bio en jus et des logements à Gbatopé suivant le marché N001/JUS DELICE/06/2018 pour un montant de 85 000 000 FCFA, suivant attestation délivrée le 13/11/2018 par le Directeur général de TIBTP et ;
 - Travaux de changement de carreaux et de confection des dalettes au siège de l'ARCE suivant attestation délivrée le 15/05/2017 par le DG i de l'ARCE .

3.6.4. Charge de l'entreprise

Le soumissionnaire DMA GROUP a fourni un plan indiquant qu'il ne dispose d'aucun marché en cours d'exécution à la date limite de remise de son offre et dans les six (06) mois suivants. Le critère de qualification au point 4 de l'annexe A du dossier de

7 Y 3 2

concurrence relative à la justification de la réalisation ou de la probabilité de l'exécution des travaux en cours à hauteur *de soixante dix pour cent (70%)* à la fin du 6^{ème} mois suivant la date limite de dépôt des offres **est sans objet**.

3.6.5. Personnel

Suivant le point 5 de l'Annexe de la DRP « Personnel », le soumissionnaire DMA GROUP a également proposé un **personnel clé qualifié composé de :**

- (1) Un (01) Conducteur des travaux : KOURA-BODJI Sadate**, Licence professionnelle en Génie Civile, 09 ans d'expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux (02) projets de nature et complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments, conformément aux exigences de la DRP notamment :
- Travaux De réhabilitation de l'immeuble ex-DADC de l'OTR suivant marché N°002/2020/CR/OTR/T/FP (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur) ;
 - Travaux de réhabilitation et pose en appareillage électrique...R+2 et R+3 de l'immeuble du Trésor et comptabilité publique (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur) ;
 - Travaux de construction des bureaux R+2 de TET Sarl (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur).
- (2) Un (01) Chef chantier : EDUWOLE Monlson Karl**, Licence professionnelle en Génie Civil suivant attestation de diplôme N°022A/EM/123/IFTS/LP-GC/14, 09 ans d'expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux (02) projets de nature et complexité similaires, en qualité de Chef de chantier des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux exigences de la DRP notamment :
- Travaux De réhabilitation de l'immeuble ex-DADC de l'OTR et installation de la vitrerie aluminium suivant marché (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur) ;
 - Travaux de construction d'un bâtiment R+1 (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur) ;
 - Travaux de construction gros œuvres d'immeuble résidentielle R+2 à Lomé à Agoè-Atiomé (attestation de **travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur**).
- (3) Expert environnementaliste : AYAH Massabalo**, DEA en Gestion de l'environnement à l'Université de Lomé, 10 ans d'expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux (02) projets de nature et complexité similaires, dont un (01) en qualité d'Expert environnementaliste conformément aux exigences de la DRP notamment :
- Travaux de construction d'un bâtiment R+1 (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur) ;
 - Travaux de construction gros œuvres d'immeuble résidentielle R+2 à Lomé à Agoè-Atiomé (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur)
 - Travaux de construction des bureaux R+2 de TET Sarl (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur).

Le soumissionnaire DMA GROUP satisfait le critère de qualification lié au personnel clé à mobiliser pour les travaux.

3.6.6. Matériel

Conformément au point 5 de l'Annexe de la DRP « Matériel », le soumissionnaire DMA GROUP a fourni la preuve de disponibilité de matériel minimum exigé pour l'exécution des travaux. Il s'agit de :

- (i) une (01) bétonnière (500 l au moins), en propriété, suivant facture N°ABAK/0012/04/2021 du 07 avril 2021 ;
- (ii) un (01) véhicule de liaison (chantier), en propriété, TOYOTA immatriculation 3555 AS suivant carte grise jointe ;
- (iii) un (01) camion benne, en propriété, immatriculé TG 7978 conformément à la carte grise délivrée T0435776 en date du 02/12/2019 et ;
- (iv) un (01) camion-citerne à eau, en propriété, immatriculé TG4804 AY conformément à la carte grise délivrée T0381281 en date du 07/06/2018.

Le soumissionnaire DMA GROUP *satisfait aux conditions de matériels minimum exigés au point 6 des critères de qualification de la DRP (Annexe A) en ce qui concerne le matériel à mobiliser pour les travaux.*

Eu égard à ce qui précède, l'offre du soumissionnaire DMA GROUP satisfait globalement aux exigences de la vérification a posteriori.

3-7 Attribution du Marché

Tableau 10 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché du Lot unique

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins-disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché) nom : DMA GROUP
a)	Adresse : 05BP : 1146 Lomé-Togo, Tél : (00228) 90 83 08 38/91 54 13 14/22 47 24 44,
b)	Email : <u>dmagroupsarl@gmail.com</u>, N° RCCM : TG-LFW-01-2020-B13-05189, NIF : 1000220347, CNSS : 39289
2.	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif nom : NA
a)	adresse : NA
b)	
3.	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun
<hr/> Principal (principaux) pays de provenance des fournitures: Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : janvier 2022	

4.	Dates prévues pour l'achèvement des travaux : avril 2022		
5.			
6.			
		Monnaie(s))	Montant(s) ou %
7.	Prix de l'offre (lu publiquement)	F CFA	39 805 657 TTC
8.	Corrections des erreurs	F CFA	0
9.	Rabais	F CFA	0
10.	Autres ajustements	F CFA	0
11.	Marché proposé	F CFA	33 733 608 FCFA HT, soit 39 805 657 FCFA TTC
12.	Catégorie de décaissements	(1) – Génie civil/Travaux bâtiments	

B 3 7 7

 u

Conclusion et Recommandations

L'évaluation des offres s'est déroulée du 07 au 09 et le 29 décembre 2021 et a fait objet d'analyses préliminaire, détaillée et a posteriori à l'issue desquelles la conformité pour l'essentiel a été prononcée.


La sous-commission technique d'évaluation a, de même, constaté que le montant de l'offre évaluée la moins-disante (**39 805 657 FCFA TTC**) proposé par l'entreprise **DMA GROUP**, est supérieur au montant prévisionnel (PPM 2021 : 26 150 000 FCFA) du service bénéficiaire (CERME), soit un gap de (13 655 657) FCFA.

La sous-commission technique chargée de l'évaluation, sur la base des données qui précèdent et se référant aux dispositions contenues dans les points IC 6.1d) de la section III des données particulières et des critères de qualification contenus dans l'Annexe A d'une part et 16.1 de la section II des IC de la DRP d'autre part, propose que le marché relatif aux « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) », soit attribué au **soumissionnaire DMA GROUP** pour un montant total de *trente-trois millions sept cent trente-trois mille six cent huit (33 733 608 HT) FCFA HT/HD, soit trente-neuf millions huit cent cinq mille six cent cinquante-sept (39 805 657) FCFA TTC.*

Toutefois, la sous-commission note aussi que les ouvrages, objet du présent marché, sont déjà pris en compte dans le cadre de l'appui du chef de l'Etat Togolais aux infrastructures scolaires et universitaires. Les travaux de rénovation de l'ENI, dans le cadre de cet appui ont déjà démarré (suivant Informations parues le 13 décembre 2021 sur le site de l'UL et la note de service N°009/ENSI/2021 du 17 décembre 2021). Ce qui est susceptible d'entraîner un doublon en matière de réalisation (doublement) des mêmes travaux sur les mêmes sites, soit l'attribution de deux (02) marchés à deux (02) prestataires pour la réalisation des mêmes travaux de même consistance sur les mêmes sites.

Cet état de chose pourrait porter préjudice à l'AC de l'UL en général et au CERME en particulier si le présent marché en venait à être attribué, voire signé.








A cet effet, la sous-commission suggère que le marché « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) » soit annulé et que les fonds dédiés soient réaffectés à d'autres activités dans le cadre du CERME en vue d'une meilleure capitalisation de ses résultats.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are five distinct marks: a checkmark-like signature, the letter 'B', a stylized signature, a stylized signature, and the number '7'.

Rapport d'évaluation des offres et recommandation pour l'attribution du marché

Fait à Lomé, le 29 décembre 2021

Ont signé,

N°	Nom	Fonction	Signature
1	M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	
2	M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Spécialiste en Passation des Marchés du CERME	
3	M. ALLOKPENOU Enoussa	Spécialiste en Gestion Financière du CERME	
4	Mme PADASSE Mazahalou Adédémèwè	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	
5	M. SEBOU Igoma	Ingénieur en génie civil à l'ENSI	
6	M. SETEKPO Ayéwu	Technicien en génie électrique à l'ENSI	
7	M. BADJO Koussowa	Membre de la cellule d'appui à la PRMP	

4


Annexes :

- Annexe 1 : Pièces administratives**
- Annexe 2 : Conformité technique des offres**
- Annexe 3 : Procès-verbal d'ouverture**
- Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-commission d'ouverture et d'évaluation des offres**
- Annexe 5 : Preuve sur la publication de l'ADRP**

Handwritten marks and symbols at the bottom right of the page, including a checkmark, a cross, and various scribbles.

Annexe 1 : Vérification de la présence et de la validité des pièces administratives et financières

Soumissionnaire	Lettre de soumission	Garantie de soumission	Registre du commerce et du crédit mobilier	Carte d'opérateur économique en cours de validité ou équivalent	Attestation de non faillite (datant de moins de 03 mois)	Quitus fiscal original (datant d'un (01) an) ou attestation de régularité fiscale datant de moins de 03 mois	Attestation de l'ITLS datant de moins de trois (03) mois	Quitus social (CNSS) datant de moins de 06 mois	Attestation de paiement de la taxe parasociale	Attestation de capacité financière	Formulaire d'engagement	Procuration (pouvoir habilitant le signataire)
ETUDES CONSTRUCTION (EC) ET	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expirée	Oui	Oui	Oui	N/A
DMA GROUP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	N/A
LOCA-BTP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expirée	Oui	Oui	Oui	N/A

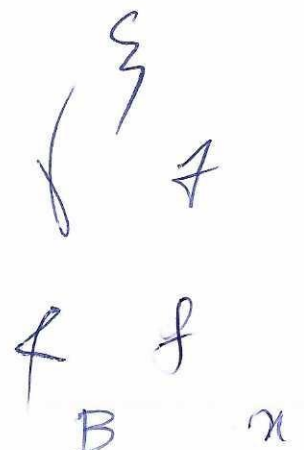

 A
 B
 f
 S
 A
 x

Annexe 2 : Conformité technique

Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)

Critères	Sociétés	ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	DMA GROUP	LOCA-BTP
Capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l'exécution du Marché		Oui	Oui	Oui
Organisation des travaux sur le site et méthode de réalisation		Oui	Oui	Oui
Calendrier de mobilisation et calendrier de construction		Oui	Oui	Oui
Autres		Oui	Oui	Oui
Conformité pour l'essentiel (OUI/NON)		OUI	OUI	OUI








Annexe 3 : Procès-verbal d'ouverture des offres

Handwritten marks and symbols in the bottom right corner, including a checkmark, the letters 'A', 'B', and 'C', and a small number '24'.



PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES OFFRES

A. - IDENTIFICATION DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Université de Lomé
01 BP 1515 Lomé 01
Lomé-Togo
Téléphone : (+228) 22 20 08 27
Fax : (+228) 22 21 85 95

Objet du marché : Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI).

Référence de la procédure : Demande de Renseignement de Prix (DRP) n° 06T/2021/UL-CERME/IDA.

Date d'initiation de la procédure : Lundi 15 novembre 2021.

B.- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS COMMISSION TECHNIQUE CHARGEE DE L'EVALUATION

La composition de la sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres a été fixée par note de service : n° 054/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021.

Date de la réunion : Mardi 07 décembre 2021 à 10 heures 30 minutes.

Membres de la sous-commission technique chargée de l'évaluation :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué
M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto	Président		
M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Rapporteur		
M. ALLOKPENOU Enoussa	Membre		
Mme PADASSE Mazahalou Adédémèwè	Membre		
M. SEBOU Igoma	Membre		
M. SETEKPO Ryéwu	Membre		
M. BADJO Koussowa	Membre		

Le quorum est atteint :


Oui,

Non.

La commission peut valablement délibérer.

3

C. – REPRESENTANTS DU SERVICE TECHNIQUE BENEFICIAIRE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué
DJONGOU LAKE K Modou	SPIL-CEPTE		

**D. – SOUMISSIONNAIRES OU LEURS REPRESENTANTS / ET AUTRES¹
(sur présentation d'un titre justificatif)**

Nom et prénoms	Qualité	Entreprise représentée	Contact
AKINYODE Olatide'	Representant	GTR	91242322
PAKOUPTERE Pierre	Representant	DMA GROUP	92405617
KOUGNAMI Jérôme	Représentant	EC	90836670
AROUNA FATAD	Representant	LOCA BTP	90015060
NANGUIM-Warapine	Representant	ECNE-BTP	70-01-45-02

¹ Y compris l'observateur indépendant de l'ARMP ou toute personne ressource



Observateur indépendant / Personnes ressources :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué



E. - DECISION DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° d'ordre au registre spécial des dépôts	Nom du candidat ou des candidats groupes Souligner le nom du mandataire	Pli Non ouvert (Oui / Non)	Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)					Commentaires
			Lettre de soumission datée et signée par la personne habilitée	Bordereau des prix et cadre des détails quantitatifs et estimatifs dûment remplis	Garantie bancaire de soumission (400 000 F CFA)	Délai de validité de l'offre (90 j)	Formulaire d'engagement à respecter les dispositions du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	
1	GIR	eui	P	P	P		P	
2	ETUDES ET CONSTRUCTIONNEL	eui	P	P	P	90 jours	P	
3	DINA GROUPE	eui	P	P	P	90 jours	P	
4	LDCA BTP	eui	P	P	P	90 jours	P	
5								
6								
7								
8								
9								

P* - Je délais ici, mais explicitement exprimé, toutefois je ne m'inscris pas dans le délai de validité de l'offre indiqué dans le dossier.

Validation de la commission des marchés publics

5

F. - LECTURE DU MONTANT DES OFFRES

N°	Nom du candidat ou des candidats groupés/Souligner le nom du mandataire	Montant HT (F CFA)	Montant TTC (F CFA)	Rabais / Remise	Observations
1	GTR.		47 138 143	7% sur TTC	
2	Etudes et construction		48 262 624	4%	
3	DMA GROUP		49 457 042	20%	
4	LOCA BTP	38 435 724	45 354 151	22%	
5					
6					
7					
8					
9					

G. - INCIDENTS EVENTUELS SURVENUS AU COURS DE LA SEANCE

Aucun incident n'est survenu au cours de la séance d'ouverture


H. - REMARQUES

- Un plis a été reçu hors de l'air (E CNGI-BTP) soit à 10h45 minutes au lieu de 10h00, heure limite.
- Aucun soumissionnaire n'a fait de remarque particulière lors de la séance d'ouverture

I. - ANNEXES

- Liste de présence des soumissionnaires et/ou leurs représentants dûment mandatés.

J. - SIGNATURES DES MEMBRES DE LA COMMISSION / REPRESENTANTS PRESENTS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE



SOSSON Aboumoussa



DIONGOU LAREK Keiani



PADASSE Razafalou A



BADJO Koussoua

2



Université
de Lomé

Cabinet du Président

Personne Responsable des *Marchés Publics*






Liste de présence

Date: Mardi, le 07 décembre 2024 à 10 heures 30 minutes -

Lieu: Salle de réunion n°2, 1ère au lycée de Tekoin I.

Objet: Séance d'ouverture relative aux travaux de réouverture des salles de classe et des laboratoires dédiés du département de génie électrique de l'ENST.

N°	NOM ET PRENOMS	TITRE	STRUCTURE REPRESENTÉE	TELEPHONE ET EMAIL	SIGNATURE
01	SOSSOU Ahmani Agan	PRMP	U.L	90 04 58 80	
02	PASSÉ Togadjo A.	Membre CRA PRMP	U.L	90 02 35 35	
03	MANOUDOU. Fouziat		U.L	90 65 98 23	

N°	NOM ET PRENOMS	TITRE	STRUCTURE REPRESENTEE	TELEPHONE ET EMAIL	SIGNATURE
04	AROUNA FATRO	Representant	LOCA BTP	90 01 50 60 locabtp.togo@gmail.com	
05	PAKOUPEHERE Payama	Representant	DMA GROUP	94 54 13 14 dmagroup@gmail.com	
06	KOU GILANI Jérôme	Representant	ETUDES ET CONSTRUCTION	90 83 66 70 ecadrl2@gmail.com	
07	AKINYOUE Gladjide	Representant	GTR	91 24 23 22 gtr198415@gmail.com	
08	NANGOLIM - WATOPISA	Representant	ECNGI-BTP	70-02-45-02	
09					
10					
11					
12					



Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-commission d'ouverture et d'évaluation des offres

Handwritten initials and symbols in the bottom right corner, including a stylized 'S', a checkmark, a 'B', a 'Z', a '7', and a 'u'.



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

CABINET DU PRESIDENT

==--==

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

--==--

NOTE DE SERVICE N° 054 /UL/CP/PRMP/2021

Portant mise en place d'une sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres relatives aux travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) pour le compte du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)

Il est mise en place, une sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres relatives aux travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI).

La sous-commission est composée comme suit :

- M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto, Président ;
- M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi, Rapporteur ;
- M. ALLOKPENOU Enoussa, Membre ;
- Mme PADASSE Mazahalou Adédémèwè, Membre ;
- M. SEBOU Igoma, Ingénieur en Génie Civil à l'ENSI, Membre ;
- M. SETEKPO Ryéwu, Technicien en Génie Electrique à l'ENSI, Membre et
- M. BADJO Koussowa, Membre.

Les membres de la sous-commission seront orientés par les personnes ci-après :

- Prof. AJAVON Ayité Sénah Akodah, Directeur du CERME ;
- Mme SOSSOU Akuavi Cicavi, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

Les membres de la sous-commission auront pour tâches :


- de participer à la séance d'ouverture publique des plis prévue le mardi 07 décembre 2021 à 10 heures 30 minutes dans la salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé ;
- de procéder à l'examen et à l'analyse des offres reçues ;
- d'élaborer le rapport d'évaluation des offres ;
- de restituer les résultats de l'évaluation des offres à la commission de passation des marchés publics de l'Université de Lomé.


Les activités se dérouleront sous la responsabilité du président de la sous-commission.

Le rapport d'évaluation des offres devra être transmis à la Personne responsable des marchés publics de l'Université de Lomé au plus tard le mercredi 22 décembre 2021.

Lomé, le 03 DEC 2021

La Personne responsable des marchés publics,


Mme Cicavi Akuavi SOSSOU



Annexe 5 : Preuve sur la publication de l'ADRP

B } A A
A A



Université
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE (CERME)



Autorité contractante : Université de Lomé (UL)

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME)

Pays (Emprunteur) : Togo

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)

Don IDA 536 IDA (Banque Mondiale)

Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingenieurs (ENSI)

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX DRP N° 067/2021/UL-CERME/IDA

01. L'Université de Lomé (UL), à travers le Centre d'Excellence pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME), sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats pour l'exécution des travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingenieurs (ENSI) en un lot unique.
- Ces travaux seront exécutés dans l'enceinte de l'Université de Lomé (UL), Boulevard GNASSINGBE EYADEMA, B.P. : 1515, Tél. : (+228) 90 17 47 63/ 90 54 62 58, email : cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org dans un délai maximum de trois (03) mois.
02. Les candidats intéressés par le présent avis, peuvent consulter le dossier de Demande de Renseignement de Prix à l'adresse, aux jours et aux heures suivants : Services de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58, e-mail : prmp_ul@univ-lome.tg / cerme_ul@univ-lome.tg, tous les jours ouvrables ; Horaires : Matin : 08 heures à 12 heures GMT et Après-midi : 15 heures à 17 heures GMT. Ils peuvent également l'obtenir à l'adresse mentionnée ci-avant, contre paiement d'une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.
- La méthode de paiement sera l'espèce.
03. Les offres devront être déposées à l'adresse, à la date et à
04. Les offres doivent comprendre une caution bancaire de soumission, d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs F CFA
- La caution de soumission devra être délivrée par une banque installée au Togo ou une banque ayant une banque correspondante au Togo.
- (NB) Les cautions délivrées par les institutions de micro finance ne seront pas acceptées et seront considérées non recevables ; ce qui entraînera la non recevabilité de l'offre.*
05. Les offres doivent demeurer valides pour une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres.
06. Les demandes d'éclaircissement seront adressées à l'autorité contractante à l'adresse suivante : Services de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58, e-mail : prmp_ul@univ-lome.tg / cermeul@univ-lome.tg.
07. Une réunion préparatoire des offres se tiendra au lieu, à l'adresse, à la date et à l'heure suivants : Salle de réunion de l'ENSI (à l'étage du bâtiment principal), site
08. La visite des sites avant la préparation et la soumission d'offres est vivement recommandée à tous les soumissionnaires. Pour ce faire, il sera procédé, à l'issue de la réunion sus mentionnée, à une séance de visites d'ensemble systématiques des ouvrages, objet du présent dossier concurrentiel, sis dans l'enceinte de l'Université de Lomé à laquelle la présence de tous les soumissionnaires est vivement souhaitée en vue de contribuer à la soumission d'offres de qualité. Toutefois, les soumissionnaires ont le choix d'effectuer individuellement et à leur gré cette visite avant la date limite de dépôt des plis à condition qu'ils survienne au cours des jours ouvrables et après l'acceptation de l'administration (contacts : 90 54 62 58, 92 33 07 24)
09. Les candidats sont informés que leurs offres financières doivent être élaborées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de référence (mercuriale des prix) disponible sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances au www.finances.gov.tg. Dans le cas contraire, leurs offres seront redressées.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse, à la date et à l'heure suivantes : Salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 01: Tél. : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58, le mardi, 30 novembre 2021 à 15 heures 30 minutes GMT



Université
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE (CERME)



Autorité Contractante : Université de Lomé (UL)

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME)

Pays (Emprunteur) : Togo

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)

Don IDA 536 IDA (Banque Mondiale)

Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)

Addendum et report de la date limite de dépôt des offres

DRP N° 06T/2021/UL-CERME/IDA

1. Suite à l'Avis de Demande de Renseignement de Prix (ADRP) N° 06T/2021/UL-CERME/IDA paru dans le quotidien national d'information (Togo-Presse) N° 11166 et 11170 en dates respectivement des 16 et 22 novembre 2021, après la réunion préparatoire des offres, couplée de visites de l'ouvrage, objet du marché sus décrit, survenue le mardi, 23 novembre 2021 et considérant la prise en compte des apports, au cours des présentes visites, il est porté à la connaissance de tous les candidats que les Cadres de Détails Quantitatifs et Estimatifs (CDQE) du dossier d'appel à concurrence initial ont subi des modifications entraînant ainsi le présent addendum dont la teneur est comme l'indique le tableau ci-après :

Références des postes (désignations) de la DRP concernés	Objet de modification	Mention Initiale	Mention actuelle (à considérer par les candidats)
(i) BATIMENT PRINCIPAL (Direction-Salles de classes-Sanitaires)			
2.3	Augmentation de quantité	1,98 m ²	6,72 m ²
2.8, 4.4, 5.4, 6.5, 7.5, 10.2,	Description du poste	Fourniture et pose prise de 2P+T	Fourniture et pose prise de 2P+T en apparent y compris toutes sujétions
3.10, 5.7	Virgule après le premier de quantité	198 m ²	1,98 m ²
12.14, 14.14	Diminution de quantité	2	1
12.8, 13.8, 14.8, 15.8	Substitution du type de porte et précisions des dimensions	Fourniture et pose d'une porte périmétrique hygiène	Fourniture et pose d'une porte en ALU (0,71 m x 2,15 m) y compris toutes sujétions
13.81, 13.142, 15.83 et 15.144	Suppression de postes	Postes 13.8, 13.14, 15.8 et 15.14 figurant dans les CDQE de la DRP initiale	Postes 13.8, 13.14, 15.8 et 15.14 figurant dans les CDQE supprimés dans le dossier modifié

13.1 à 13.15	Intégration du grand poste 13 et ses sous-composantes (13.1 à 13.15)	Absent	Intégration du poste 13 et ses sous-composantes de 13.1 à 13.15
(ii) MAISON BLANCHE			
2.5	Unité	m ²	U

NB / Pour plus de détails et une meilleure prise en compte des présentes modifications dans la détermination des prix des offres, les candidats sont priés de retirer la dernière version le CBP U et le CDQE à l'adresse décrite au point 2 du présent addendum.

2. Les candidats sont également informés que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le mardi, 30 novembre 2021 à 15 heures GMT, est reportée et maintenue au mardi, 07 décembre 2021 au même lieu : Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : +228 90 54 62 58/91 63 07 36/91 75 32 45 à 10 heures GMT.
Les offres seront ouvertes le même jour à 10 heures 30 minutes GMT.

3. Il est rappelé aux candidats qu'ils ne peuvent soumettre leurs offres qu'en version physique « main » à l'adresse ci-dessus décrite.

4. En application des directives du gouvernement en date du 10 septembre 2021 relatives aux conditions d'organisation des réunions de service et de fréquentation des bâtiments publics par les usagers, l'accès aux salles de dépôt et d'ouverture des plis est subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19.

5. Toutes les autres conditions restent et demeurent inchangées.

6. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au « Service de la commande publique de l'Université de Lomé, sis dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tél. : +228 91 91 61 07 36/91 75 32 45/90 54 62 58, e-mail : pmp_ul@univ-lome.tg/cerme_ul@univ-lome.tg »
